

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ**

за 9 месяцев 2018 года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| Наименование отчитывающейся организации |  |                        |               | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск"<br>"Волгодонская городская электрическая сеть" |  |                  |   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
|---|--|------------------------|---------------|--|--|------------------|---|------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|
| Почтовый адрес                          |  |                        |               | 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39  |  |                  |   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| № п/п                                   | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ   | Сроки выполнения работ |               | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.   | Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС) |                  |   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
|   |  | Год начала             | Год окончания |  | ВСЕГО  |                  | по виду деятельности "Передача электрической энергии" |                  |                           |              |                                  |              | по виду деятельности "Технологическое присоединение**" |                |                                  |              |
|   |  |                        |               |  |  |                  | Амортизация/ Возврат капитала                         |                  | Прибыль/ Доход на капитал |              | Заемные средства/ Привл. капитал |              | Плата за ТП  |                | Заемные средства/ Привл. капитал |              |
|   |  |                        |               |  | план   | факт             | план  | факт             | план                      | факт         | план                             | факт         | план   | факт           | план                             | факт         |
| 3                                       | 4  | 6                      | 7             | 8  | 9  | 10               | 11  | 12               | 13                        | 14           | 15                               | 16           | 17   |                |                                  |              |
|   | <b>ВСЕГО</b>   |                        |               | <b>8 911,016</b>   | <b>8 911,016</b>   | <b>2 007,325</b> | <b>8 911,016</b>                                      | <b>1 168,446</b> | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>838,879</b> | <b>0,000</b>                     | <b>0,000</b> |
|   | в том числе по видам деятельности  |                        |               |  |  |                  |   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
|   | передача электрической энергии   |                        |               | 8 911,016  | 8 911,016  | 1 168,446        | 8 911,016   | 1 168,446        |                           |              |                                  |              | 0,000  | 0,000          |                                  |              |
|   | технологическое присоединение  |                        |               | 0,000  | 0,000  | 838,879          | 0,000   | 0,000            |                           |              |                                  |              | 0,000  | 838,879        |                                  |              |
| <b>1.</b>                               | <b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>  |                        |               | <b>8 911,016</b>   | <b>8 911,016</b>   | <b>1 168,446</b> | <b>8 911,016</b>                                      | <b>1 168,446</b> |                           |              |                                  |              | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |                                  |              |
| 1.1.                                    | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  |                        |               | 7 866,101  | 7 866,101  | 1 168,446        | 7 866,101   | 1 168,446        |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| 1.1.1.                                  | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60   | 2018                   | 2018          | 1 361,017  | 1 361,017  | 1 048,364        | 1 361,017   | 1 048,364        |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| 1.1.2.                                  | Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10           | 2018                   | 2018          | 1 849,153  | 1 849,153  | 37,775           | 1 849,153   | 37,775           |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| 1.1.3.                                  | Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55 | 2018                   | 2018          | 2 434,745  | 2 434,745  | 0,000            | 2 434,745   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| 1.1.4.                                  | Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25  | 2018                   | 2018          | 2 221,186  | 2 221,186  | 0,000            | 2 221,186   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| 1.1.5.                                  | Приобретение комплекта для резки кабеля под напряжением НГПИ-85  | 2018                   | 2018          | 0,000  | 0,000  | 82,307           | 0,000   | 82,307           |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| 1.2.                                    | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики   |                        |               | 226,286  | 1 044,915  | 0,000            | 1 044,915   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| 1.2.1.                                  | Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60   | 2018                   | 2018          | 226,286  | 1 044,915  | 0,000            | 1 044,915   |                  |                           |              |                                  |              |  |                |                                  |              |
| <b>2.</b>                               | <b>Новое строительство</b>   |                        |               | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>838,879</b>   | <b>0,000</b>  |                  |                           |              |                                  |              | <b>0,000</b>   | <b>838,879</b> |                                  |              |
| 2.1.                                    | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  |                        |               | 0,000  | 0,000  | 0,000            | 0,000   |                  |                           |              |                                  |              |  | 0,000          |                                  |              |
| 2.2.                                    | Прочее новое строительство   |                        |               | 0,000  | 0,000  | 838,879          | 0,000   |                  |                           |              |                                  |              |  | 838,879        |                                  |              |
| 2.2.1.*                                 | Строительство ВЛН-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10  | 2018                   | 2018          |  |  | 34,762           |   |                  |                           |              |                                  |              |  | 34,762         |                                  |              |
| 2.2.2.*                                 | Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска                                       | 2018                   | 2018          |  |  | 545,412          |   |                  |                           |              |                                  |              |  | 545,412        |                                  |              |
| 2.2.3.*                                 | Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16  | 2018                   | 2018          |  |  | 49,797           |   |                  |                           |              |                                  |              |  | 49,797         |                                  |              |
| 2.2.4.*                                 | Строительство ВЛН-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25  | 2018                   | 2018          |  |  | 23,671           |   |                  |                           |              |                                  |              |  | 23,671         |                                  |              |
| 2.2.5.*                                 | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а   | 2018                   | 2018          |  |  | 37,283           |   |                  |                           |              |                                  |              |  | 37,283         |                                  |              |
| 2.2.6.*                                 | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 36   | 2018                   | 2018          |  |  | 33,003           |   |                  |                           |              |                                  |              |  | 33,003         |                                  |              |

| 1       | 2   | 3    | 4    | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15     | 16 | 17 |
|---------|---|------|------|---|---|--------|---|---|----|----|----|----|----|--------|----|----|
| 2.2.7.* | Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23        | 2018 | 2018 |   |   | 55,934 |   |   |    |    |    |    |    | 55,934 |    |    |
| 2.2.8.* | Строительство двух КП-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40 | 2018 | 2018 |   |   | 40,597 |   |   |    |    |    |    |    | 40,597 |    |    |
| 2.2.9.* | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15   | 2018 | 2018 |   |   | 18,420 |   |   |    |    |    |    |    | 18,420 |    |    |


\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Руководитель организации

Ю. В. Попов

(ф.и.о.)

М.П.

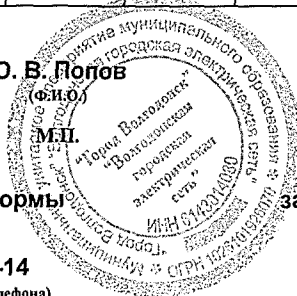

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

заместитель главного инженера

(должность)

И. Т. Бадулин

(ф.и.о.)

(863 9) 25-69-14  
(номер контактного телефона)

"24" "10" 2018 год  
(дата составления документа)

(подпись)




| 1          | 2   | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 2.2.3*     | Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 1б       | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |    |    |    |    |    |
|            | в том числе ПТП   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
| 2.2.4*     | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25   | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |    |    |    |    |    |
|            | в том числе ПТП   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
| 2.2.5*     | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а                    | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |    |    |    |    |    |
|            | в том числе ПТП   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
| 2.2.6*     | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 3б                      | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |    |    |    |    |    |
|            | в том числе ПТП   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
| 2.2.7*     | Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23        | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |    |    |    |    |    |
|            | в том числе ПТП   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
| 2.2.8*     | Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |    |    |    |    |    |
|            | в том числе ПТП   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
| 2.2.9*     | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15   | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |    |    |    |    |    |
|            | в том числе ПТП   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
| Справочно: |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |
|            | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |    |    |    |

Строительство в рамках выполнения обязательств по договорам технологического присоединения

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО



И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова




| 1      | 2  | 3     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18    | 19    | 20    | 21    | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29   | 30 | 31  | 32    | 33    | 34 | 35 | 36 |
|--------|--|-------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-----|-------|-------|----|----|----|
| 2.2.3* | Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16<br>в том числе ПТП       | 0,000 |   |   |   |   | 0,059 | 0,030 |       | 0,029 |    |    |    |    |    |    | 0,059 | 0,030 |       | 0,029 |    |    |    |    |    |    |    |      |    |     |       |       |    |    |    |
| 2.2.4* | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатыревскому, 25<br>в том числе ПТП   | 0,000 |   |   |   |   | 0,028 |       | 0,010 | 0,018 |    |    |    |    |    |    | 0,028 | 0,000 | 0,010 | 0,018 |    |    |    |    |    |    |    | 2018 | 30 | ж/б | СИП-2 | 0,055 |    |    |    |
| 2.2.5* | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а<br>в том числе ПТП                    |       |   |   |   |   | 0,044 | 0,044 |       |       |    |    |    |    |    |    | 0,044 | 0,044 |       |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |     |       |       |    |    |    |
| 2.2.6* | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 36<br>в том числе ПТП                      |       |   |   |   |   | 0,039 | 0,039 |       |       |    |    |    |    |    |    | 0,039 | 0,039 |       |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |     |       |       |    |    |    |
| 2.2.7* | Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23<br>в том числе ПТП        |       |   |   |   |   | 0,066 |       | 0,036 | 0,010 |    |    |    |    |    |    | 0,066 |       | 0,036 | 0,010 |    |    |    |    |    |    |    |      |    |     |       |       |    |    |    |
| 2.2.8* | Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40<br>в том числе ПТП |       |   |   |   |   | 0,048 | 0,048 |       |       |    |    |    |    |    |    | 0,048 | 0,048 |       |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |     |       |       |    |    |    |
| 2.2.9* | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15<br>в том числе ПТП   |       |   |   |   |   | 0,022 | 0,022 |       |       |    |    |    |    |    |    | 0,022 | 0,022 |       |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |     |       |       |    |    |    |

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО



И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей  
за 9 месяцев 2018 года

Утверждаю  
Директор ДПМ "ВГЭС"  
Ю. В. Попов  
" 10 " 2018 года  
М.П.

| № №     | Источник финансирования  | Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года |              |              |              |              |              |              |              |               |              | Причины отклонений |
|---------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
|         |  | всего                                       |              | I кв.        |              | II кв.       |              | III кв.      |              | IV кв.        |              |                    |
|         |  | план  | факт         | план         | факт         | план         | факт         | план         | факт         | план          | факт         |                    |
| 1       | Собственные средства   | 10,515                                      | 2,368        | 0,000        | 0,097        | 0,000        | 0,123        | 0,000        | 2,148        | 10,515        | 0,000        |                    |
| 1.1.    | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 0,000                                       | 0,990        | 0,000        | 0,097        | 0,000        | 0,123        | 0,000        | 0,770        | 0,000         | 0,000        |                    |
| 1.1.1.  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 0,000                                       | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000        |                    |
| 1.1.2.  | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.1.3.  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000                                       | 0,990        | 0,000        | 0,097        | 0,000        | 0,123        | 0,000        | 0,770        | 0,000         | 0,000        |                    |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  | 0,000                                       | 0,990        | 0,000        | 0,097        | 0,000        | 0,123        | 0,000        | 0,770        | 0,000         | 0,000        |                    |
| 1.1.4.  | Прочая прибыль   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.2.    | Амортизация  | 10,515                                      | 1,379        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 1,379        | 10,515        | 0,000        |                    |
| 1.2.1.  | Амортизация, учтенная в тарифе   | 10,515                                      | 1,379        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 1,379        | 10,515        | 0,000        |                    |
| 1.2.2.  | Прочая амортизация   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.2.3.  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.3.    | Возврат НДС  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.4.    | Прочие собственные средства  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.4.1.  | в т.ч. средства допэмиссии   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 1.5.    | Остаток собственных средств на начало года                             |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.      | Привлеченные средства, в т.ч.:   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.1.    | Кредиты  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.2.    | Облигационные займы  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.3.    | Займы организаций  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.4.    | Бюджетное финансирование   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.5.    | Средства внешних инвесторов  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.6.    | Использование лизинга  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
| 2.7.    | Прочие привлеченные средства   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
|         | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                 | <b>10,515</b>                               | <b>2,368</b> | <b>0,000</b> | <b>0,097</b> | <b>0,000</b> | <b>0,123</b> | <b>0,000</b> | <b>2,148</b> | <b>10,515</b> | <b>0,000</b> |                    |
|         | для ОГК/ТГК, в том числе   |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
|         | ДПМ  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |
|         | вне ДПМ  |   |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                    |

Начальник ПЭО



Л. Г. Макарова





| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       | 11 | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 11* | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а                    |   |   |   |   |   |   |   |          |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 12* | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 3б                      |   |   |   |   |   |   |   |          |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 13* | Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23        |   |   |   |   |   |   |   | 0,065 км |    | 0,065 км |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 14* | Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40 |   |   |   |   |   |   |   |          |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 15* | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15   |   |   |   |   |   |   |   |          |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин

## Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за 9 месяцев 2018 года

Утверждаю  
Директор МУП "ВЭС"  
Ю. В. Попов  
"24" *Сентябрь* 2018 года  
М.П.  
млн. руб.

| Наименование показателя                                     | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | на конец 2018 года/за 2018 год |
|---|---|--------------------------------|
| место учета   |   |                                |
| 1   | 2   | 3                              |
| Выручка   | 40,728  | 115,098                        |
| Чистая прибыль (убыток)                                     | 0   | 0                              |
| Направления распределения чистой прибыли:                   |   |                                |
| дивиденды   |   |                                |
| другое (расшифровать), в т. ч.:                             |   |                                |
| КУИГ  |   |                                |
| фонд накопления   |   |                                |
| фонд потребления  |   |                                |
| ЕВИТДА  |   |                                |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.:                          | 18,941  | 18,941                         |
| покупатели и заказчики                                      | 14,632  | 14,632                         |
| авансы выданные   | 0,238   | 0,238                          |
| Собственный капитал   | 143,648   | 143,648                        |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:     | 0,102   | 0,102                          |
| кредиты   |   |                                |
| облигационные займы   |   |                                |
| займы организаций   |   |                                |
| прочее  | 0,102   | 0,102                          |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.:                        | 43,824  | 43,824                         |
| кредиты и займы*  | 5,000   | 5,000                          |
| кредиторская задолженность, в т.ч.:                         | 38,824  | 38,824                         |
| по строительству  |   |                                |
| по ремонтам   |   |                                |
| по поставкам топлива  |   |                                |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам           | 0,248   | 0,755                          |
| <b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>        |   |                                |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 0,220   | 0,220                          |
| Профинансировано на отчетную дату                           | 0,220   | 0,220                          |
| Обеспеченность источниками финансирования                   | 0,220   | 0,220                          |
| Дефицит финансирования                                      | 0,000   | 0,0                            |
| <b>Оценка кредитного потенциала</b>                         |   |                                |
| Собственная оценка кредитного потенциала:                   |   |                                |
| на 2018 г.  |   |                                |
| на период 2015 - 2018 гг.                                   |   |                                |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала                  |   |                                |

Главный бухгалтер

*И. Г. Нефёдова*

И. Г. Нефёдова

Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"  
за 9 месяцев 2018 года

Утверждаю  
Директор МУП "ВГЭС"  
Ю. В. Попов  
2018 года



| № п/п | Наименование направления/<br>проекта инвестиционной программы  | Технические характеристики |                          |                 | Сроки реализации проекта         |                                  | Наличие исходно-разрешительной документации                              |  |   |   |
|-------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|
|       |  | мощность,<br>МВт, МВА      | выработка,<br>млн. кВт/ч | длина ВЛ,<br>км | год начала<br>строи-<br>тельства | год ввода<br>в эксплуа-<br>тацию | утверж-<br>денная<br>проектно-<br>сметная<br>докумен-<br>тация<br>(+; -) | заключен-<br>ные<br>Главгос-<br>экспертизы<br>России<br>(+; -) | оформ-<br>ленный<br>в соот-<br>ветствии<br>с законода-<br>тельством<br>землеотвод<br>(+; -) | разрешение<br>на строи-<br>тельство<br>(+; -) |
| 1     | 2  | 3                          | 4                        | 5               | 6                                | 7                                | 8  | 9  | 10  | 11  |
| 1     | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60   | 80                         |                          |                 | 2018                             | 2018                             | +  | Не требуется   | +   | Не требуется                                  |
| 2     | Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10           |                            |                          |                 | 2018                             | 2018                             | Не требуется   | Не требуется   | +   | Не требуется                                  |
| 3     | Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55 |                            |                          |                 | 2018                             | 2018                             | Не требуется   | Не требуется   | +   | Не требуется                                  |
| 4     | Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25  |                            |                          |                 | 2018                             | 2018                             | Не требуется   | Не требуется   | Не требуется  | Не требуется                                  |
| 5     | Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60   |                            |                          |                 | 2018                             | 2018                             | -  | Не требуется   | +   | Не требуется                                  |
| 6*    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10  |                            |                          | 0,126           | 2018                             | 2018                             | +  | Не требуется   | +   | Не требуется                                  |
| 7*    | Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска                                       |                            |                          | 1,157           | 2018                             | 2018                             | +  | Не требуется   | +   | Не требуется                                  |
| 8*    | Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16  |                            |                          | 0,075           | 2018                             | 2018                             | +  | Не требуется   | Не требуется  | Не требуется                                  |
| 9*    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25  |                            |                          | 0,055           | 2018                             | 2018                             | +  | Не требуется   | Не требуется  | Не требуется                                  |
| 10*   | Приобретение комплекта для резки кабеля под напряжением НГПИ-85  |                            |                          |                 | 2018                             | 2018                             | Не требуется   | Не требуется   | Не требуется  | Не требуется                                  |
| 11*   | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а   |                            |                          | 0,160           | 2018                             | 2018                             | +  | Не требуется   | Не требуется  | Не требуется                                  |

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5     | 6    | 7    | 8 | 9            | 10           | 11           |
|-----|---|---|---|-------|------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12* | Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 3б                      |   |   | 0,085 | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 13* | Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23        |   |   | 0,065 | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 14* | Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40 |   |   | 0,312 | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 15* | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15   |   |   | 0,186 | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется |

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин
